

3 道路等の復旧対応状況

1 公道（県道・市道）の復旧について

○ 工事着手に向けた準備を順次進めており、全体の約7割は今年度末までに工事発注の予定。

< 公道復旧工事の発注見込み >

(箇所)

	R 6 (実績)	R 7	R 8	計
中央区	2	31	5	38
江南区	2	16	13	31
南区	2	—	—	【完了】 2
西区	17	137	80	234
西蒲区	1	—	—	【完了】 1
計	24	184	98	306

※箇所数は災害査定の実施数

< 公道の復旧イメージ >



<被害状況>

<復旧後のイメージ>

2 下水道の復旧について

○ 管路の復旧工事では、災害査定件数35件のうち、約6割にあたる21件を発注済。

○ 現在、家屋の事前調査 やガス・水道管の移設工事を進めており、その後管路の復旧工事に着手。

○ 管路施設の復旧工事は、令和8年度までの完了を目指す。

3 私道の復旧について

○ 私道災害復旧支援制度に基づく復旧では、現地立会は概ね完了し、工事は約50%が完了。


○ 令和7年度末での工事完了を目指し支援していく。

< 私道災害復旧の進捗状況 (R7.3末時点) >

(件)

申請受付	現地立会	工事着手	工事完了
429	428	248	210

< 私道の復旧イメージ >

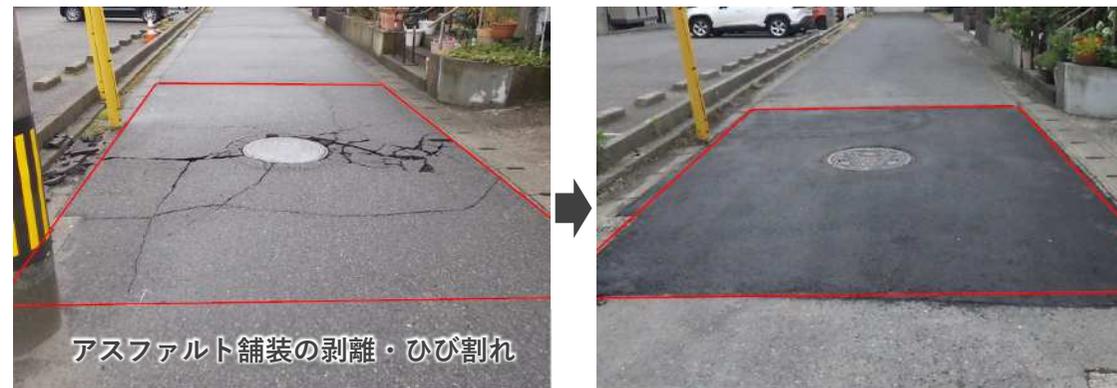

<被害状況>

<復旧後のイメージ>
