

2 被災した家屋等の解体・撤去 (公費解体) の現状

1. 進捗状況〔R7.7.10時点〕


(R6.12.27受付終了)

○ 申請件数	1,046件	100.0%
公費解体	944件	
費用償還	102件	

○ 解体計画済 ※1	1,026件	98.1%
解体着手済	839件	80.2%
現在工事中	73件	7.0%
解体完了	766件	73.2%
市解体完了分	664件	63.5%
費用償還	102件	9.8%
解体未着手	187件	17.9%
○ 解体計画未定 ※2	20件	1.9%

※1 解体の計画がある案件

※2 解体が未定案件の課題の内容
転居先未定、転居先建設中、ほか

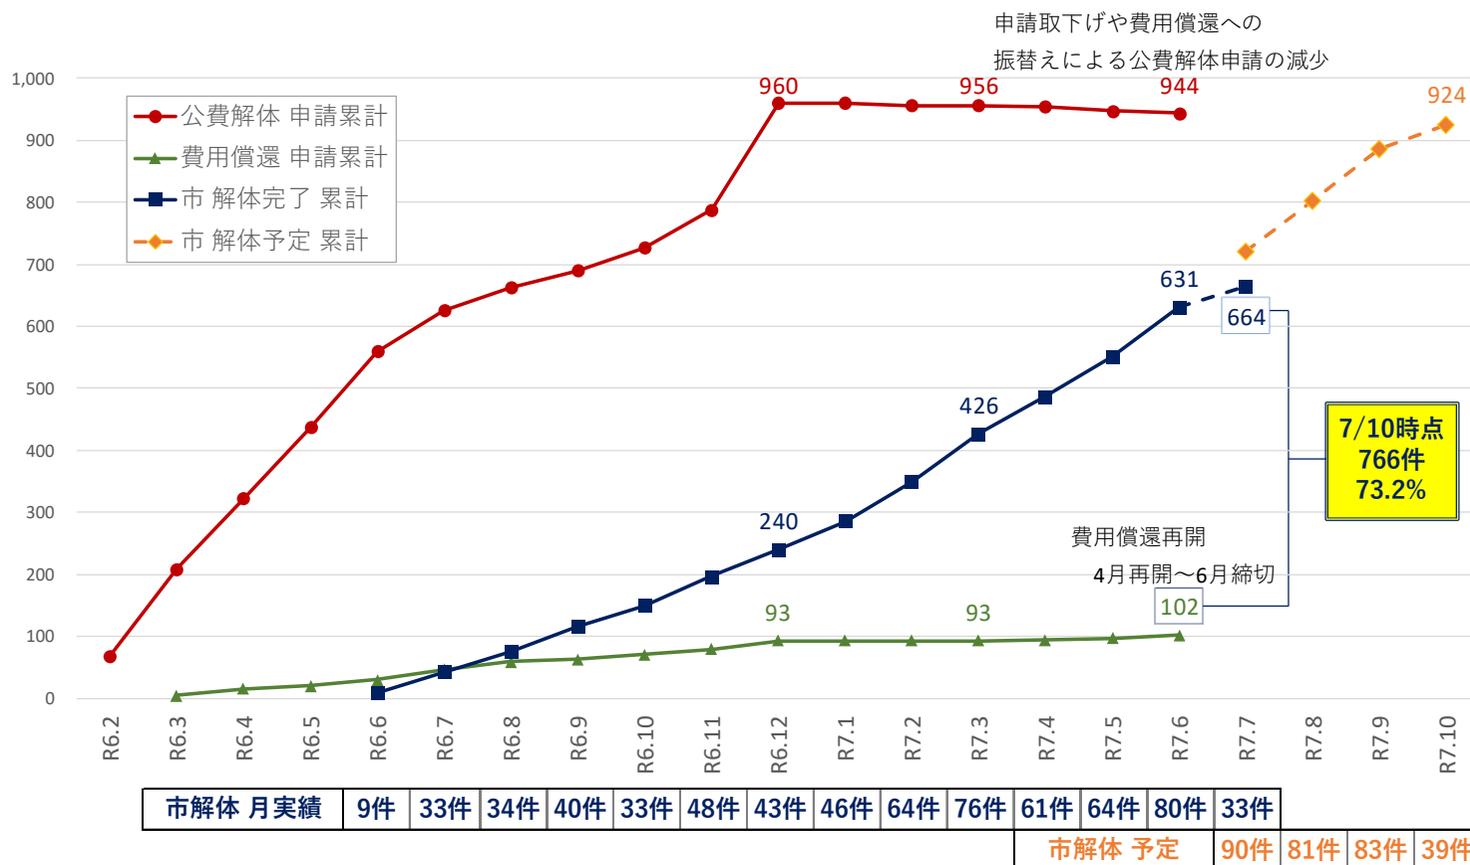

2. 現状について

- 4月以降、月90件以上の解体を目指したが、申請者の準備が間に合わない案件等により未達成。
- 5月から、環境部職員を申請毎に担当させ、申請者の準備状況を詳細に把握し必要に応じて解体準備に伴走。あわせて、委託先である一般社団法人新潟県解体工事業協会から解体工程表の提出を受け、解体事業者との連携を密にしなが、割振り変更なども行い、6月は過去最高の80件の解体を実施。



引き続き、10月までの解体完了に向け、計画的に進めていく。
なお、計画未定案件を含め、被災者の住まいの再建に向け、ささえあいセンターや関連部署と連携し、円滑に解体が進むよう取り組んでいく。
