第３号
令和８年 10月13日


あまのみらい通信
～ 街区単位の液状化対策について ～

【発行元】
新潟市 都市政策部
都市計画課 街区液状化対策室
TEL 025-226-2683


≫『集水管設置』の工事見学会を実施しました

9月4日（金）に、「集水管設置」の工事見学会を実施し、約20人の方からご参加いただきました。推進工法による集水管の設置工事の様子などをご覧いただきました。

～参加された方の主なご感想とご質問～




説明の様子

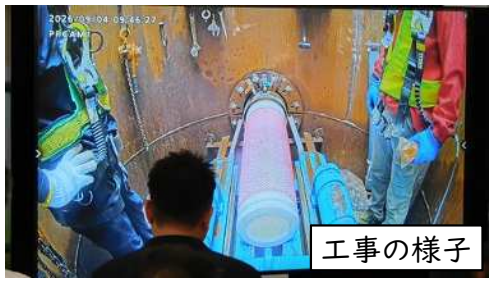
工事の様子

≫試験施工の『工事』が完了しました

9月末で鋼矢板（こうやいた）や集水管（しゅうすいかん）などを設置する「工事」が完了し、くみ上げ用のポンプなどを含め、**地下水をくみ上げるための準備が整いました**。工事へのご理解・ご協力ありがとうございました。

引き続き地下水のくみ上げと併せて、地下水位や地盤などの「観測」を半年～1年程度行います。


くみ上げ用ポンプ

≫試験施工の『観測』を開始しました

10月13日（火）から、**地下水のくみ上げを開始しました。**

くみ上げ開始直後は、地盤への影響を考慮し、時間をかけて、1mずつ段階的に地下水位を下げていきます。地下水位の変化と併せて、地盤や模擬家屋（もぎかおく）（鉄板を重ね、家屋と同程度の重さを再現）の沈下などの観測を行います。

地下水位が目標とする地表から3m程度まで下がりましたら、**地域の皆さまへ観測結果などをお知らせするための説明会を開催する予定です。**

説明会の詳細は、次号のあまのみらい通信でお知らせします。


くみ上げの様子（試運転時）


予 告

地下水くみ上げ状況の説明会を開催します！

★詳しくは、次号のあまのみらい通信第４号でお知らせします★

【開催期日】※予定
11月中旬～下旬

【会場】※予定
曽野木ことぶき公園



【問合せ】
新潟市 都市政策部 都市計画課 街区液状化対策室
TEL：025-226-2683　メール：tokei@city.niigata.lg.jp
